



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

от 13 июня 2024 г. № 299

г. Кызыл

**Об утверждении доклада о реализации
государственной программы Республики
Тыва «Повышение эффективности и
надежности функционирования
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Тыва на 2014-2025 годы»
за период с 2014 по 2023 годы**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259, и постановлением Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» Правительство Республики Тыва **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» за период с 2014 по 2023 годы.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва



В. Ховалыг

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 13 июня 2024 г. № 299

ДОКЛАД
о реализации государственной программы
Республики Тыва «Повышение эффективности и
надежности функционирования жилищно-коммунального
хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы»
за период с 2014 по 2023 годы

1. Общая часть

Государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267 (далее – государственная программа), государственным заказчиком является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва. Основными исполнителями государственной программы являются Министерство строительства Республики Тыва (далее – Минстрой РТ) и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва (далее – Министерство ЖКХ РТ).

Реализация государственной программы осуществляется в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2007 г. № 316 «Об утверждении Правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 80-р, посланий Президента Российской Федерации, Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва, приоритетных направлений Министерства ЖКХ РТ и Минстроя РТ на 2014-2023 годы.

Период реализации государственной программы с 2014 по 2023 годы.

Основными целями государственной программы являются: создание условий для дальнейшего повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг для населения, обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности; повышение качества услуг и эффективности оборудования и материалов, используемых при выработке услуг, уровня обеспеченности населения коммунальными услугами, надежности и качества коммунальных услуг; повышение качества питьевой воды для населения республики до 47,6

процента посредством реконструкции систем водоснабжения; формирование эффективной системы обращения с отходами; обеспечение населения республики и бюджетных учреждений (социальных объектов) в отопительный период твердым топливом (углем).

Задачи государственной программы: повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе масштабной модернизации систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий, создания системы планирования развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; формирование системы государственной поддержки для развития и модернизации коммунальной инфраструктуры в городах и сельских поселениях; развитие систем централизованного, автономного и нецентрализованного водоснабжения и водоотведения на базе новых технологий и оборудования в городах и поселениях, где существуют проблемы с обеспечением населения питьевой водой; повышение качества питьевой воды республики до 47,6 процента посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий; развитие системы по вывозу твердых бытовых отходов, увеличение охвата населенных пунктов республики системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; ликвидация несанкционированных мест размещения отходов; строительство и обустройство угольных складов на территории республики; приобретение техники, в том числе специализированной.

Государственная программа состоит из шести подпрограмм: «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы», «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы», «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной, на 2014-2025 годы», «Формирование современной городской среды на территориях муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год», «Чистая вода на 2019-2024 годы» и «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы».

2. Результаты реализации государственной программы

В рамках реализации подпрограммы 1 «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 годы» выполнены следующие мероприятия в период в 2014 по 2023 годы:

По линии Минстроя РТ:

мероприятия по комплексному развитию систем водоотведения и очистки сточных вод существенно уменьшено количество не законного слива ЖБО на грунт и в водоемы:

по индивидуальной программе социально-экономического развития с вводом объектов по строительству напорного коллектора г. Кызыл подключены:

восточная часть г. Кызыла к централизованным сетям водоотведения за счет разгрузки сетей водоотведения в центральной части города и ТД «Альма», ТД «Империял»;

существующие жилые дома, социальные и другие объекты (здание АО «Россельхозбанк», ЦУМ, ТД «Алексеевский», строящийся дом по ул. Ленина, д. 54);

школа № 17 к централизованной системе водоотведения и многоквартирные дома по ул. Олега Саган-оола;

построен канализационный коллектор 2-ой очереди мкрн. Энергетиков г. Кызыла, подключены к централизованной системе водоотведения многоквартирные дома в мкрн. Энергетиков.

В рамках мероприятия по комплексному развитию систем теплоснабжения:

проведена реконструкция тепловых сетей в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна;

обеспечена поставка и монтаж модульной котельной в г. Чадане Дзун-Хемчикского кожууна (жилфонд).

В рамках мероприятия по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры микрорайонов жилой застройки:

обеспечено строительство наружных инженерных сетей электро-, теплоснабжения и водоотведения и их подключение к построенным многоквартирным домам по ул. Убсу-Нурская, д. 2, 4, 8, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 24, мкрн. по ул. Московской, д. 46 (для многодетных семей);

подключен дом по ул. Ангарский бульвар, 31а к наружным инженерным сетям и благоустроена его территория, заселены 40 семей или 109 граждан из 13 аварийных домов;

подключены дома по ул. Иркутская, д. 11, 13, 14 к наружным инженерным сетям, заселены 79 семей или 212 граждан из 32 аварийных домов;

дома по ул. Дружбы, д. 26, 28, 30, 32 в г. Кызыле подключены к наружным инженерным сетям, заселены 115 семей или 304 гражданина из 44 аварийных домов;

обеспечен ввод в эксплуатацию и функционирование садика по ул. Дружба 1/1;

построены наружные инженерные сети к жилым домам по ул. О. Саган-оола и к школе № 17;

дом по ул. Дружбы, д. 37а в г. Кызыле подключен к наружным инженерным сетям, заселены 80 семей или 205 граждан из 46 аварийных домов;

дом по ул. Дружбы, д. 1/2 в г. Кызыле подключен к наружным инженерным сетям, заселены 34 семей или 105 граждан из 13 аварийных домов;

обеспечено строительство водопровода по ул. Красных партизан г. Кызыла;

построены инженерные сети к объекту «Терапевтический корпус, г. Кызыл»; разработаны технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличена потребляемая мощность терапевтического корпуса, где организован госпиталь для стабилизации эпидемиологической

ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией, в котором имеется четыре отделения: терапевтическое на 48 коек, неврологическое на 30 коек, клинической иммунологии на 32 койки, иммунизации и гастроэнтерологии;

обеспечено подключение к наружным инженерным сетям здания ТИГИ;

обеспечен ввод и функционирование детского сада на 280 мест по ул. Дружба г. Кызыла.

По индивидуальной программе социально-экономического развития подключены к централизованной системе теплоснабжения 2 дома по ул. Саган-оола, д. 4/1, д. 4/2 в г. Кызыле для переселения граждан из аварийного жилья, обеспечения жильем детей-сирот и коммерческого жилья;

проложены наружные инженерные сети для МКД по ул. Лопсанчапа, д. 37/13, 37/14;

подключены к системе ХВС и водоотведения (восточная сторона с юга ул. Ангарский бульвар 12, 14, 15, 16).

В рамках мероприятия по «Благоустройству многоквартирных домов по программе переселения» за 2020-2023 гг. благоустроено 27 прилегающих территорий построенных домов по программе переселения граждан из аварийного жилья и обеспечения жильем детей-сирот, в том числе:

а) в с. Хову-Аксы 7 прилегающих территорий многоквартирных домов;

б) в г. Кызыле 20 прилегающих территорий многоквартирных домов.

За весь период реализации мероприятия создано 63 сезонных рабочих места.

Разработаны проектно-сметные документации объектов «Строительство очистного сооружения в г. Кызыл Республики Тыва, положительное заключение государственной экспертизы от 5 декабря 2022 г. № 17-1-1-3-085087-2022, «Строительство очистных сооружений канализации с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района Республики Тыва» и «Строительство очистных сооружений канализации, г. Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва».

В рамках отбора инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств бюджетных кредитов, одобрено 4 инфраструктурных проекта на обеспечение наружными инженерными сетями объектов капитального строительства в рамках комплексной застройки четырех микрорайонов «Спутник», 3 и 4 кварталы, «Монгун», на территории западнее от ул. Полигонная д. 2 и «Иркутский» г. Кызыла.

Соглашение о реализации инфраструктурных проектов, финансируемых из средств бюджетных кредитов, между Правительством Республики Тыва и Минстроем России заключено 27 января 2022 г. № 12-22/С.

Республике Тыва выделены лимиты на общую сумму 1 331 745,0 тыс. рублей, которые распределены:

- мкрн. «Спутник» 3-4 кварталы – 384 443,9 тыс. рублей;

- мкрн. «Монгун» – 300 000,0 тыс. рублей;

- мкрн. «Полигонный» – 305 111,1 тыс. рублей;

- мкрн. «Иркутский» – 342 190,0 тыс. рублей.

За весь период реализации мероприятия создано 544 сезонных рабочих места.

По линии Министерства ЖКХ РТ выполнены следующие мероприятия:

1. Мероприятие по строительству и обустройству угольных складов реализована в 2022-2023 годы.

В 2022 году построен 1 угольный склад в г. Кызыле и обустроены 7 топливных (угольных) складов в Бай-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Монгун-Тайгинском, Тес-Хемском, Тандинском, Овюрском, Эрзинском кожуунах на общую сумму 76 407,00 тыс. рублей. Выполнены работы по основанию, ограждению, косметическому ремонту зданий, устройству металлического препятствия, по отоплению и электрике. В г. Кызыле выполнены работы по асфальтированию площадки под уголь, по площадкам (армирование под фундамент) под автовесы, завершены работы по установке весового оборудования, подключено электроснабжение по договору с АО «Россети Сибирь Тываэнерго». Выполнены работы по уличному освещению и установке видеонаблюдения. Общий объем выполненных работ по топливным складам составляет 100 процентов. По строительству нового топливного склада в г. Кызыле проведены расчеты стоимости строительных материалов. Выполнены работы по асфальтированию площадки под уголь, установке понижающего трансформатора, электроснабжению.

В 2023 году обустроено 5 топливных (угольных) складов в г. Туране Пий-Хемского, с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского, с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна, гг. Шагонаре и Чадане на общую сумму 69 504,00 тыс. рублей.

На поставку строительных материалов, выполнение работ, монтаж систем видеонаблюдения, охрану угольных складов, изготовление блок-модуля заключено 55 договоров.

На поставку, установку и модернизацию автомобильных весов между ГУП «Транспортный сервис и проект» (далее – ГУП «ТСП») и ООО «ТТС Инжиниринг» заключен контракт № 1/2023 от 24 мая 2023 г. Модернизированы старые весы в с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна и г. Туране, а также установлены автомобильные весы в с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна и в г. Чадане.

Оформлены правоустанавливающие документы на 5 земельных участков под размещение топливных складов: в сс. Сарыг-Сеп, Суг-Аксы, гг. Турана, Шагонара и г. Чадана.

Реализация каменного угля населению на топливных складах осуществляется в штатном режиме.

В 2022-2023 годах создано 52 постоянных рабочих места в рамках реализации мероприятия по строительству и обустройству угольных складов в республике.

2. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок и вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории республики реализованы в 2022-2023 годах:

В 2022 году ликвидированы несанкционированные свалки и вывезены ТКО в Тандинском, Сут-Хольском, Пий-Хемском, Кызылском кожуунах, в г. Чадане Дзун-Хемчикского кожууна и в г. Кызыле. Объем вывезенных ТКО из мусорных бункеров по республике составляет 59557,00 тонн (397 046,73 куб.

м), ликвидировано 15 несанкционированных свалок с общим объемом 592 388,33 куб. м на сумму 104 615,00 тыс. рублей.

Согласно приказу Минприроды Республики Тыва от 20 декабря 2021 г. № 668 ГУП «ТСП» присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Тыва. ГУП «ТСП», оснащено 55 единицами современной специализированной техники, которые привлекались на выполнение работ по вывозу ТКО и ликвидации несанкционированных свалок.

Заключено 1612 договоров, в том числе с юридическими лицами – 1024, физическими лицами – 330, ИП – 258.

Всего по Республике Тыва 124 несанкционированных свалки с общим объемом 3 318 300 куб. м.

В 2023 году ГУП «ТСП» ликвидированы несанкционированные свалки, вывезено 69 236 тонн мусора (461 574,0 куб. м) на сумму 48 985,0 тыс. рублей в г. Ак-Довураке, Улуг-Хемском, Чаа-Хольском и Дзун-Хемчикском кожуунах.

ГУП «ТСП» на вывоз ТКО заключено 4503 договора, в том числе с юридическими лицами – 1929, физическими лицами – 2090, ИП – 484.

Фактические расходы ГУП «ТСП» на указанные объемы несанкционированных свалок в проектно-сметной документации (ПСД) муниципальных образований значительно превышены. Согласно ПСД запланированный объем ликвидации составлял 1543374 куб. м на сумму 15 180,0 тыс. рублей, а фактический объем выполненных работ составляет – 1304720 куб. м на сумму 31 130,0 тыс. рублей.

Создано более 100 рабочих мест в рамках реализации мероприятия в 2022-2023 годах в ГУП «ТСП».

3. Приобретение оборудования по сбору ТКО (бункеры 8 куб. м).

В 2022 году приобретена 221 единица бункеров для твердых коммунальных отходов объемом 8 куб. м при плане 150 штук по контракту от 4 августа 2022 г. № 1 между ГУП «ТСП» и ООО «Глобус», г. Красноярск на сумму 10 52 млн. рублей. Мусорные бункеры приобретаются в основном для вывоза мусора, образованного в частных домовладениях. Поставка бункеров осуществлена, они распределены по г. Кызылу – 163 ед., Кызылскому кожууну – 58 ед.

В 2023 году приобретено 170 бункеров и 218 контейнеров для сбора отходов при плане 143 ед. на сумму 11 445,21 тыс. рублей, которые установлены на отведенных площадках.

4. Субсидии на возмещение понесенных затрат.

С 2021 по 2023 годы выделены субсидии на возмещение понесенных затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение, вырабатываемые муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энерго/теплоресурсов и воды по следующим ресурсоснабжающим организациям в счет погашения долгов по электроэнергии, налогам и сборам, заработной плате и материалов для ремонтных работ объектов ЖКХ, для приобретения угля и на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование	Субсидии на возмещение понесенных затрат, тыс. рублей		
		2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	ООО «Бай-Хаактепло», Тандинский кожуун	7274,0	5303,4	6061,0
2	МУП «Коммунальное хозяйство», Каа-Хемский кожуун	0	890,3	944,0
3	ООО «Байыр», с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна	497,1	510,1	531,1
4	МУП «Чаа-Холь Источник», Чаа-Хольский кожуун	752,3	2879,5	2574,1
5	МУП «Тепловик», Пий-Хемский кожуун	2273,8	3734,4	4134,9
6	ООО «Водопроводно-канализационные сети», Чеди-Хольский кожуун	14837,5	16303,8	16195,84
7	МУП «Благоустройство», г. Кызыл (водоколоники)	5548,0	5258,1	7115,2
8	МУП «Енисей», МУП «Аварийно-ремонтная служба», г. Кызыл	1452,7	0	0
9	МУП «Сайзырал», Эрзинский кожуун	230,9	357,4	134,9
10	ООО «Услуги ВИС», с. Сукпак Кызылский кожуун	0	0	1654,6
11	МУП «Алды-Шынаа г. Шагонар», Улуг-Хемский кожуун	0	0	5334,9
	Всего:	33243,8	35237,0	44680,54

По подпрограмме 2 «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной, на 2014-2025 годы» выполнены следующие мероприятия:

в целях оказания поддержки муниципальных образований Республики Тыва в рамках реализации подпрограммы субсидии на софинансирование расходных обязательств бюджетам муниципальных районов Республики Тыва предоставляются с условием софинансирования из республиканского бюджета в размере 70 процентов и местных бюджетов в размере не менее 30 процентов.

За период с 2014 по 2023 год приобретена следующая специализированная техника (далее – спецтехника):

в 2014 году Агентством по ЖКХ Республики Тыва было приобретено 4 единицы спецтехники на сумму 7 734,7 тыс. рублей для нужд г. Кызыла: 3 единицы универсальной машины КО829А1-01, 1 единица мини-погрузчика Forway WS60, также приобретено навесное оборудование к мини-погрузчику;

в период с 2015 по 2016 годы в рамках реализации данной подпрограммы не были предусмотрены средства на приобретение спецтехники;

в 2017 году было приобретено 6 единиц спецтехники на сумму 16 001,0 тыс. рублей, из них РБ – 14 072,0 тыс. рублей, МБ – 1 929,0 тыс. рублей:

- г. Кызыл – 3 единицы: автоцистерна вакуумная 4671ИБ на шасси Камаз 65115-42, мусоровоз КО-4449-35 с боковой загрузкой на шасси МАЗ 5340В3, эвакуатор на шасси Газ – А21R22;

- Кызылский кожуун – 3 единицы: автоцистерна вакуумная (на шасси Камаз), 4671Н2-40, автоцистерна вакуумная (на шасси ГАЗ-СА3), 39014-10, мусоровоз с боковой нагрузкой ГАЗ-СА3, 3901-11;

в 2018 году было приобретено 7 единиц спецтехники на сумму 17 538,95 тыс. рублей, из них РБ – 13 143,0 тыс. рублей, МБ – 4 395,95 тыс. рублей:

- Сут-Хольский кожуун – 1 единица – экскаватор-бульдозер «Елазовец» ЭО-2621 ЕМ;

- Тандинский кожуун – 1 единица – мусоровоз на шасси ГАЗ;

- Улуг-Хемский кожуун – 2 единицы – погрузочно-уборочная машина ПУМ 4853 на базе трактора Беларус 82.1, с коммунальным отвалом и щеткой и прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6,5;

- Чаа-Хольский кожуун – 1 единица – ЕК-18-20 экскаватор одноковшовый пневмоколесный;

- Чеди-Хольский кожуун – 1 единица – экскаватор-бульдозер на базе трактора Беларус 82.1;

- г. Ак-Довурак – 1 единица – трактор Беларус 82.1;

в 2019 году было приобретено 8 единиц спецтехники на сумму 14 258,95 тыс. рублей, из них РБ – 9 888,0 тыс. рублей, МБ – 4 370,95 тыс. рублей:

- Бай-Тайгинский кожуун – 1 единица – трактор с полуприцепом с системой самозакачки и пожаротушения со снегоуборочной щеткой;

- Дзун-Хемчикский кожуун – 1 единица – экскаватор с грабли-волокушками, бочкой поливальной, отвалом МТЗ-82 с элементами 2ДЗ, кун;

- Монгун-Тайгинский кожуун – 1 единица – грузовой автомобиль УАЗ;

- Овюрский кожуун – 1 единица – экскаватор на шасси МТЗ с оборудованием;

- Тес-Хемский кожуун – 2 единицы – погрузочно-уборочная машина ПУМ 4853 (на базе трактора Беларус 82.1), прицеп тракторный самосвальный 2ПТСЕ-4,5, погрузчик быстросъемный многофункциональный без рабочих органов с ковшем ПБМ-800-2 Ковш 0,8;

- Барун-Хемчикский кожуун – 1 единица – трактор Беларус 82.1;

- г. Ак-Довурак – 1 единица – автогидроподъемник ВИПО-18-01-33068;

в 2020 году было приобретено 5 единиц спецтехники на сумму 20 886,6 тыс. рублей, из них РБ – 14 828,1 тыс. рублей, МБ – 6 058,5 тыс. рублей:

- Барун-Хемчикский кожуун – 1 единица – автогрейдер;

- г. Кызыл – 4 единицы: мусоровоз с боковой загрузкой на базе ГАЗ 1 единица, мусоровоз на базе КАМАЗ 1 единица, КАМАЗ (самосвал) 2 единицы;

в 2021 году приобретено 7 единиц спецтехники на сумму 24 252,41 тыс. рублей, из них РБ – 16 791,8 тыс. рублей, МБ – 7 460,61 тыс. рублей:

- Тес-Хемский кожуун – 1 единица – экскаватор-погрузчик «Елазовец» ЭП-2626У на базе трактора МТЗ 82.1;

- Тандинский кожуун – 1 единица – экскаватор-погрузчик «ELAZ-BL»;

- Тере-Хольский кожуун – 1 единица – трактор МТЗ 82.1 с фронтальным погрузчиком Т-21 «Вепрь», грунторез;

- Каа-Хемский кожуун – 1 единица – трактор Беларус 82.1, погрузчик тракторный с ковшем, прицепом самосвальным 2ПТС-5, с щеткой коммунальной ЩКН-2;

- Сут-Хольский кожуун – 1 единица – вакуумная машина КО-522 на шасси Газон Некст;

- Улуг-Хемский кожуун – 1 единица – мусоровоз с задней загрузкой на базе ГАЗ-С41R3 Газон Некст;

- г. Ак-Довурак – 1 единица – автокран КС-5732 на шасси УРАЛ-4320 «Челябинец» (в 2022 году была передана в республиканскую собственность в связи с отсутствием софинансирования из местного бюджета);

в 2022 году было приобретено 67 единиц спецтехники, из них:

1) для муниципальных образований приобретено 6 единиц спецтехники на сумму 12 383,67 тыс. рублей, из них республиканский бюджет 10 199,20 тыс. рублей, местный бюджет 2 184,5 тыс. рублей:

- 1 единица – Пий-Хемскому кожууну экскаватор с отвалом (с комплектом навесного оборудования);

- 5 единиц прицепы-цистерны тракторные для Монгун-Тайгинского, Овюрского, Чаа-Хольского, Эрзинского и Бай-Тайгинского кожуунов;

2) через АО «Сберлизинг» приобретено 55 единиц техники, в том числе специализированной для угольных складов на общую сумму 111 494,95 тыс. рублей, из них:

- 34 единицы по первому контракту, в том числе полуприцеп-самосвал Тонар – 6 единиц, самосвал КАМАЗ 6520-53 – 4, прицеп НЕФАЗ – 9, седельный тягач МАЗ – 2, самосвал КАМАЗ – 12, топливозаправщик КамАЗ – 1 единица;

- 11 единиц по второму контракту ОВ/Ф-247628-05-01 от 30 августа 2022 г., в том числе: самосвал КАМАЗ-6520-53 – 3 единицы; погрузчик универсальный АМКАДОР – 3; погрузчик универсальный АМКАДОР – 2; экскаватор одноковшовый колесный – 1; бульдозер гусеничный ЧЕТРА – 1; мусоровоз с задней загрузкой МК-4546-08 – 1 единица;

- 8 единиц по третьему контракту, в том числе: седельный тягач МАЗ – 4 единицы, полуприцеп-самосвал Тонар – 4 единицы;

- 2 единицы по четвертому контракту;

3) приобретен фронтальный погрузчик JINGONG JGM620E в количестве 6 единиц по контракту с ООО «Карьерные машины» для работы по вывозу ТКО и для угольных складов г. Кызыла и муниципальных образований на сумму 17 700,0 тыс. рублей;

в 2023 году приобретены в лизинг с АО «Сберлизинг» 12 единиц, из них 6 фронтальных погрузчиков и 6 самосвалов КАМАЗ 53605-А5 для угольных складов на общую сумму 52 600,0 тыс. рублей (в 2023 г. – 27 066,9 тыс. рублей).

Ежемесячные лизинговые платежи по контрактам № 1, 2, 3, заключенным с АО «Сберлизинг», оплачены на сумму 39 441,93 тыс. рублей.

В связи с дефицитом республиканского бюджета субсидии муниципальным образованиям Республики Тыва на обеспечение специализированной техникой в республиканском бюджете на 2023 год не предусмотрены.

По подпрограмме 3 «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы»:

в 2018 году построены водоклонки в 5 муниципальных образованиях по одной единице в с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского, с. У-Шынаа Тес-Хемского, с. Качык Эрзинского, с. Саглы Овюрского, с. Хонделен Барун-Хемчикского

кожуунов на сумму 7 053,58 тыс. рублей, из них РБ – 4 967,9 тыс. рублей, МБ – 2 085,68 тыс. рублей;

в 2019 году построены водоклонки в 4 муниципальных образованиях по одной единице в с. Тарлаг Пий-Хемского, с. Сарыг-Холь Овюрского, с. Терлиг-Хая Кызылского, с. Шуурмак Тес-Хемского кожуунов на сумму 5 472,0 тыс. рублей, из них РБ – 3 830,0 тыс. рублей, МБ – 1 642,0 тыс. рублей;

в 2023 году построены водоклонки в 7 муниципальных образованиях (Барун-Хемчикском, Дзун-Хемчикском, Кызылском, Тес-Хемском, Улуг-Хемском, Эрзинском кожуунах и г. Кызыле) в количестве 23 единицы на сумму 11 142,2 тыс. рублей, из них РБ – 7 769,3 тыс. рублей, МБ – 3 372,9 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» в 2017 году участвовали 6 муниципальных образований, благоустроено 30 дворовых территорий и 4 территории общего пользования:

дворовые территории: г. Шагонар – 3 единицы, с. Хову-Аксы – 4, г. Кызыл – 15, г. Ак-Довурак – 4, г. Чадан – 2, с. Кызыл-Мажалык – 2 единицы;

благоустройство территорий общего пользования: г. Кызыл – 3 единицы, г. Чадан – 1 единица;

обустройство мест массового отдыха населения (городских парков): г. Кызыл – 1 единица.

В рамках реализации подпрограммы 5 «Чистая вода» в 2019-2023 годах на территории Республики Тыва построены и реконструированы 4 объекта питьевого водоснабжения:

1) реконструкция водозабора, г. Шагонар», введен в эксплуатацию 28 декабря 2022 г.;

2) реконструкция водозабора и магистрального водовода в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано администрацией Чеди-Хольского кожууна 29 декабря 2023 г.;

3) «Повысительная насосная станция в микрорайоне «Иркутский» г. Кызыла, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано мэрией г. Кызыла 25 декабря 2023 г.;

4) подводящие сети водопровода для объекта: Повысительная насосная станция «Иркутская» г. Кызыла, акт сдачи-приемки выполненных работ между заказчиком и подрядчиком от 26 декабря 2023 г.

3. Финансирование государственной программы

Общий объем финансирования государственной программы на период с 2014 по 2023 годы составил:

за счет всех источников финансирования 5 084 049,13 тыс. рублей:

в 2014 г. – 7 734,70 тыс. рублей;

в 2015 г. – 40 478,50 тыс. рублей;

в 2016 г. – 95 003,40 тыс. рублей;

в 2017 г. – 228 308,89 тыс. рублей;

в 2018 г. – 313 203,63 тыс. рублей;

в 2019 г. – 497 184,44 тыс. рублей;
 в 2020 г. – 531 466,89 тыс. рублей;
 в 2021 г. – 468 068,92 тыс. рублей;
 в 2022 г. – 1 337 109,05 тыс. рублей;
 в 2023 г. – 1 565 490,71 тыс. рублей, в том числе:
 за счет средств федерального бюджета – 1 981 741,07 тыс. рублей:
 в 2017 г. – 71 334,30 тыс. рублей;
 в 2019 г. – 67 168,90 тыс. рублей;
 в 2020 г. – 467 942,37 тыс. рублей;
 в 2021 г. – 194 798,29 тыс. рублей;
 в 2022 г. – 224 056,14 тыс. рублей;
 в 2023 г. – 956 441,07 тыс. рублей;
 за счет средств республиканского бюджета – 3 029 808,17 тыс. рублей:
 в 2014 г. – 7 734,70 тыс. рублей;
 в 2015 г. – 40 478,50 тыс. рублей;
 в 2016 г. – 95 003,40 тыс. рублей;
 в 2017 г. – 155 045,59 тыс. рублей;
 в 2018 г. – 306 722,00 тыс. рублей;
 в 2019 г. – 385 002,59 тыс. рублей;
 в 2020 г. – 57 466,02 тыс. рублей;
 в 2021 г. – 265 810,02 тыс. рублей;
 в 2022 г. – 1 110 868,43 тыс. рублей;
 в 2023 г. – 605 676,92 тыс. рублей;
 за счет средств муниципальных бюджетов – 33 499,88 тыс. рублей:
 в 2017 г. – 1 929,00 тыс. рублей;
 в 2018 г. – 6 481,63 тыс. рублей;
 в 2019 г. – 6 012,95 тыс. рублей;
 в 2020 г. – 6 058,50 тыс. рублей;
 в 2021 г. – 7 460,61 тыс. рублей;
 в 2022 г. – 2 184,48 тыс. рублей;
 в 2023 г. – 3 372,72 тыс. рублей;
 за счет внебюджетных средств – 39 000,00 тыс. рублей:
 в 2019 г. – 39 000,00 тыс. рублей.

Фактическое кассовое освоение подпрограммы «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2023 годы» составило:

Годы	Всего (тыс. рублей)	Из них РБ (тыс. рублей)	ФБ (тыс. рублей)	Внебюджетные средства (тыс. рублей)
2015	40 478,50	40 478,50	0	0
2016	95 003,40	95 003,40	0	0
2017	137 219,61	137 219,61	0	0
2018	288 611,10	288 611,10	0	0
2019	409 606,09	370 606,09	0	39 000,0
2020	351 780,29	41 049,92	310 730,37	0

Годы	Всего (тыс. рублей)	Из них РБ (тыс. рублей)	ФБ (тыс. рублей)	Внебюджетные средства (тыс. рублей)
2021	331 616,65	247 228,46	84 388,19	0
2022	1 047 557,20	978 940,36	68 616,84	0
2023	521 638,34	521 638,34	0	0
Итого:	3 223 511,17	2 720 775,77	463 735,40	39 000,0

В том числе по мероприятию «Благоустройство многоквартирных домов по программе переселения и детей-сирот»:

Годы	Всего (тыс. рублей)	Из них ФБ (тыс. рублей)	РБ (тыс. рублей)
2020	6 258,0	0	6 258,0
2021	96 111,0	0	96 111,0
2022	38 096,0	0	38 096,0
2023	36 174,0	0	36 174,0
Итого:	176 639,0	0	176 639,0

Финансирование средств бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов из федерального бюджета (далее – ИБК) предусмотрено:

- в 2022 году – 632 889,0 тыс. рублей;
- в 2023 году – 307 036,0 тыс. рублей;
- в 2024 году – 216 959,0 тыс. рублей;
- в 2025 году – 174 859,0 тыс. рублей.

Все средства инфраструктурного бюджетного кредита предусмотрены на финансирование инженерной инфраструктуры для застройки новых создаваемых микрорайонов в г. Кызыле. В 2022 и 2023 годах всего профинансировано 939 930,0 тыс. рублей, из них по мероприятиям:

- водоснабжение – 148 930,0 тыс. рублей;
- водоотведение – 148 650,0 тыс. рублей;
- электроснабжение – 310 900,0 тыс. рублей;
- теплоснабжение – 331 450,0 тыс. рублей.

Фактическое кассовое освоение подпрограммы «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» составило:

Годы	Всего (тыс. рублей)	Из них РБ (тыс. рублей)	МБ (тыс. рублей)
2018	7 053,58	4 967,90	2 085,68
2019	5 472,00	3 830,00	1 642,00
2023	11 242,95	7 869,34	3 372,72
Итого:	23 767,63	16 667,24	7 100,40

Фактическое кассовое освоение подпрограммы «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной, на 2014-2025 годы» составило:

Годы	Всего (тыс. рублей)	Из них РБ (тыс. рублей)	МБ (тыс. рублей)
2014	7734,70	7734,70	0
2017	16 001,00	14 072,00	1 929,00
2018	17 538,95	13 143,00	4 395,95
2019	14 258,95	9 888,00	4 370,95
2020	20 886,60	14 828,10	6 058,50
2021	24 252,41	16 791,80	7 460,61
2022	132 542,37	130 357,90	2 184,48
2023	66 508,03	66 508,03	0
Итого:	299 723,01	273 323,52	26 399,49

Фактическое кассовое освоение подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» составило:

Годы	Всего (тыс. рублей)	Из них ФБ (тыс. рублей)	РБ (тыс. рублей)
2017	75 088,28	70 514,0	4 574,0

Фактическое кассовое освоение подпрограммы «Чистая вода» составило:

Годы	Всего (тыс. рублей)	Из них ФБ (тыс. рублей)	РБ (тыс. рублей)
2019	67 847,4	67 168,9	678,5
2020	158 800,0	157 212,0	1 588,0
2021	112 199,86	110 410,1	1 789,76
2022	157 009,48	155 439,3	1 570,18
2023	966 102,0	956 441,0	9 661,0
Итого:	1 461 958,74	1 446 671,3	15 287,44


4. Оценка эффективности реализации государственной программы

Сравнительный анализ фактических показателей эффективности государственной программы по целевым индикаторам, утвержденным государственной программой, плановых и фактически достигнутых результатов государственной программы отражены в приложении к настоящему докладу.


Из таблицы видно, что плановые значения индикаторов государственной программы достигнуты в полном объеме.

Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию государственной программы, оценка влияния фактических результатов реализации государственной программы на различные виды деятельности экономики и социальной сферы (мультипликативный эффект от реализации государственной программы):

1. Обновление технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства техникой, в том числе специализированной, ед.

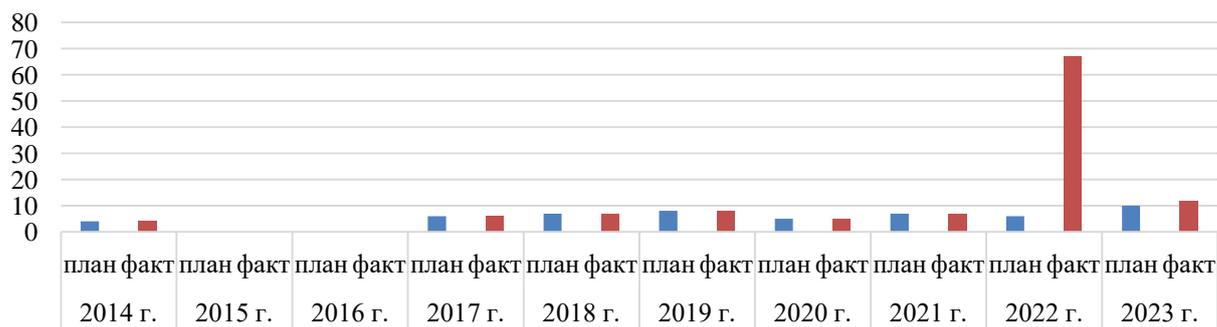


2. Снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 2022 года включительно на 29 процентов

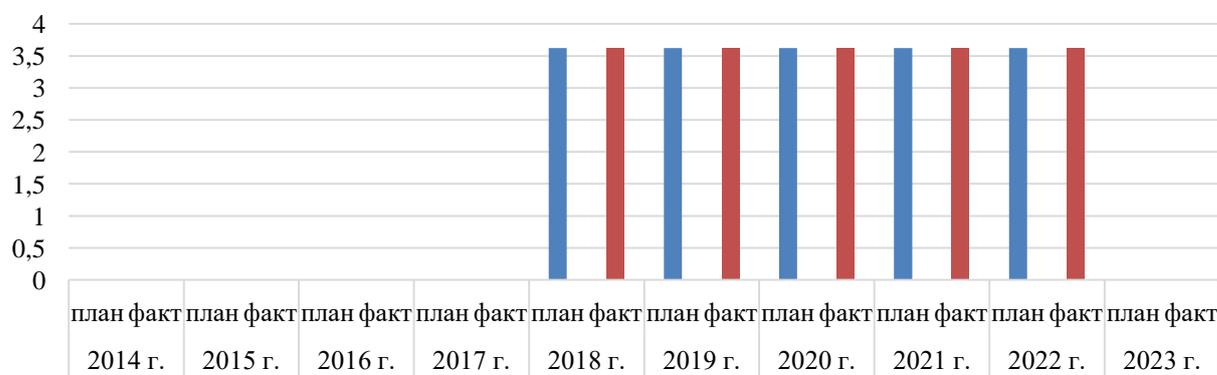


3. Сохранение рабочих мест в действующих малых котельных и водоснабжающих организациях, ед.




4. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, ед.

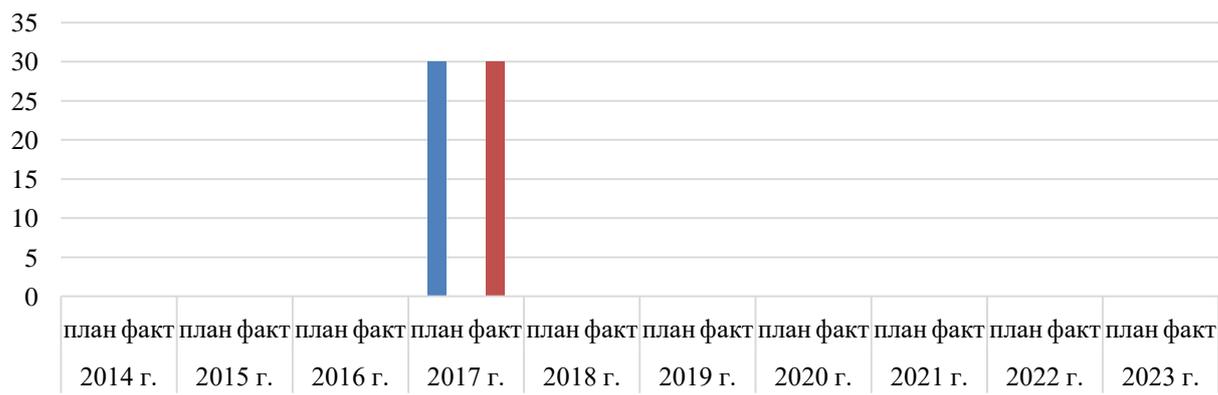


5. Повышение обеспеченности подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды, из них по строительству локальных систем водоснабжения, ед.

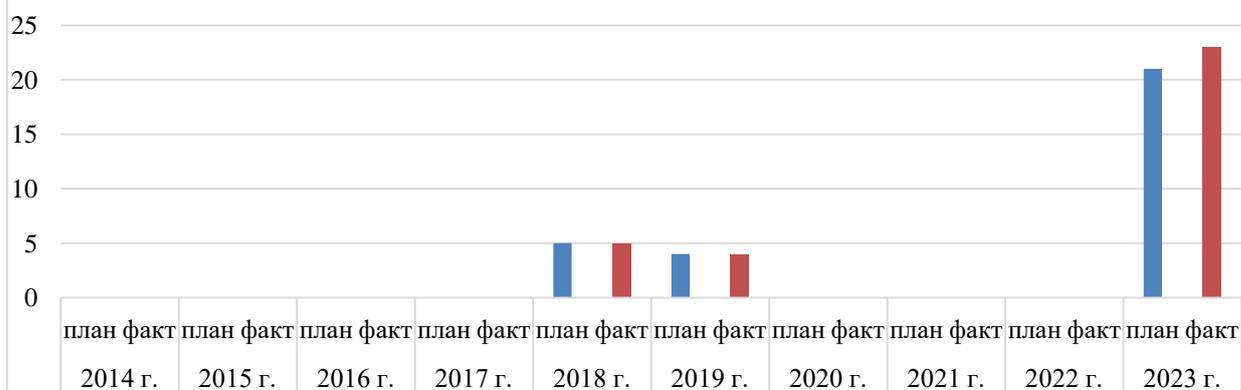


6. Создание рабочих мест, ед.

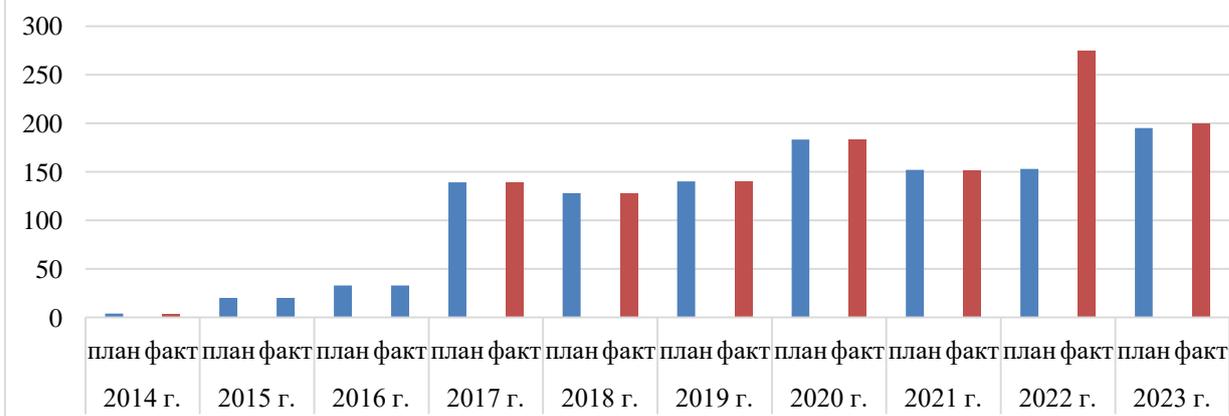


7.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры на 2017 год и снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 60 процентов по теплоснабжению на 2017 год составляет 75,6 процента

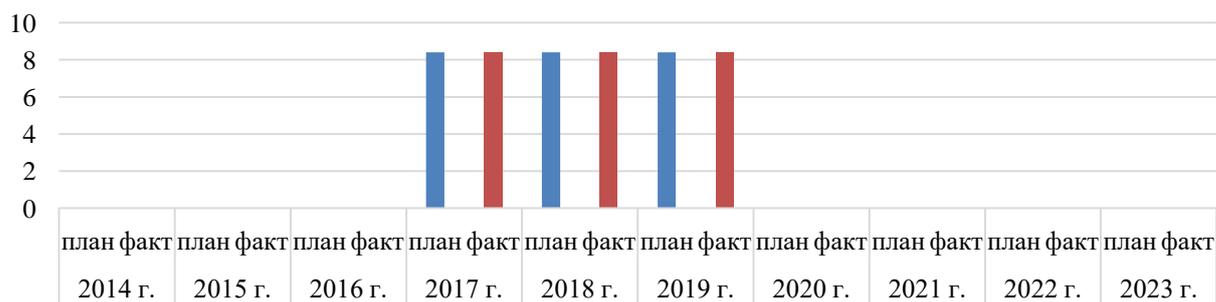


7.2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры на 2017 год и снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 60 процентов по водоснабжению на 2017 год составляет 77 процентов




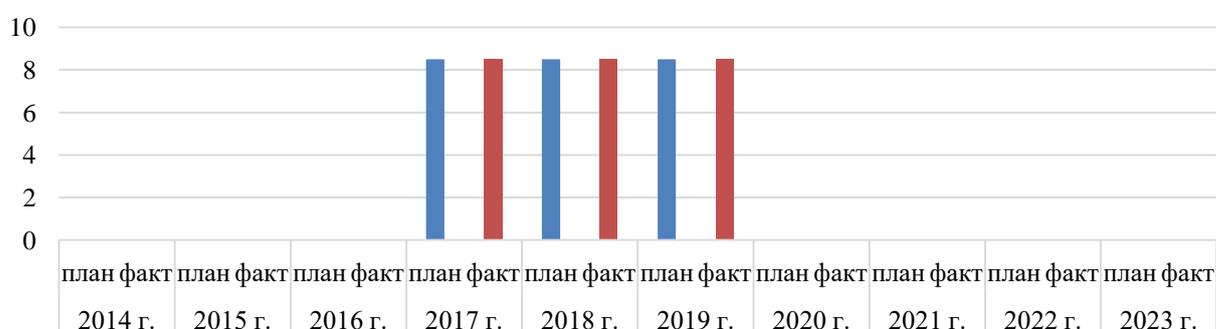


7.3. Уровень износа коммунальной инфраструктуры на 2017 год и снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 60 процентов по водоотведению на 2017 год составляет 57,1 процента

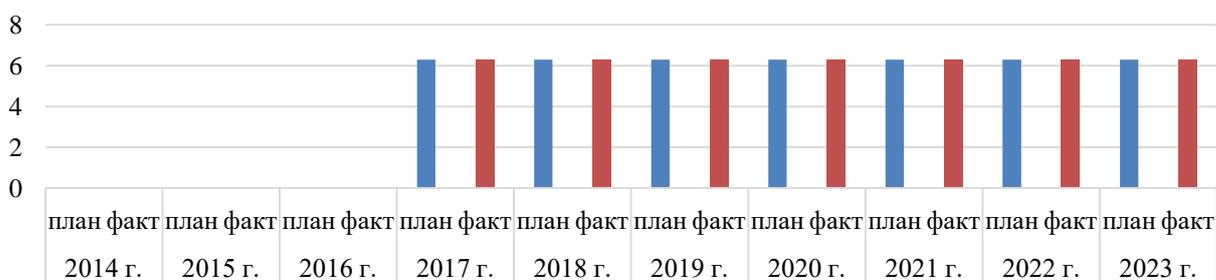

8. Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2024 году до показателя 47,6 процента (базовое значение 24,5 процента)

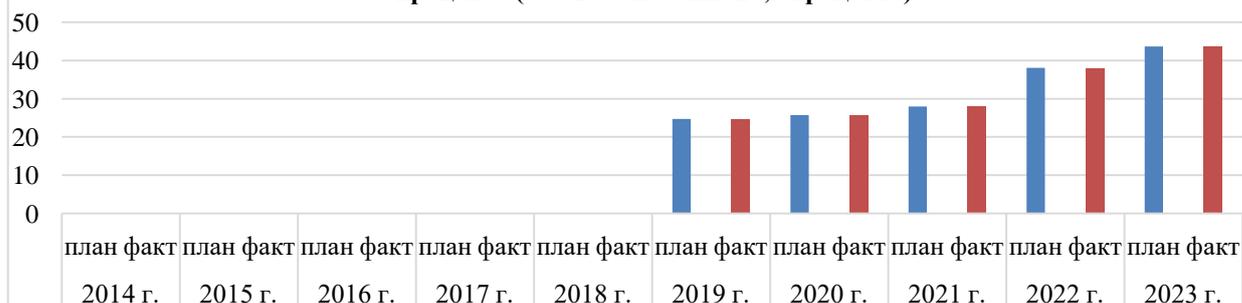

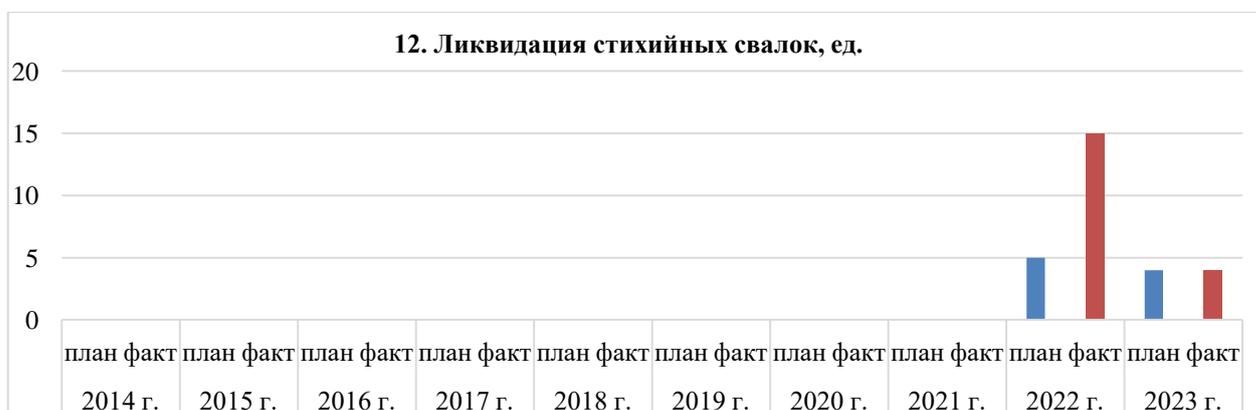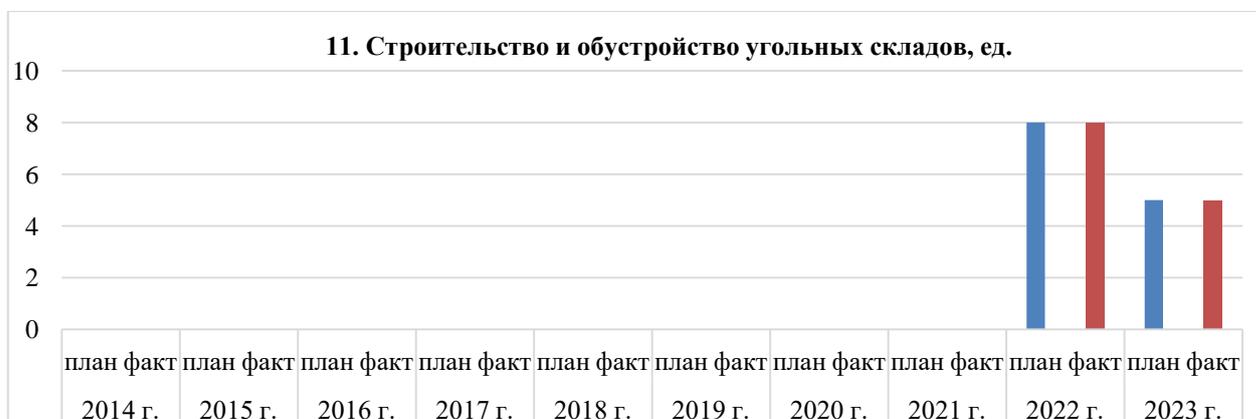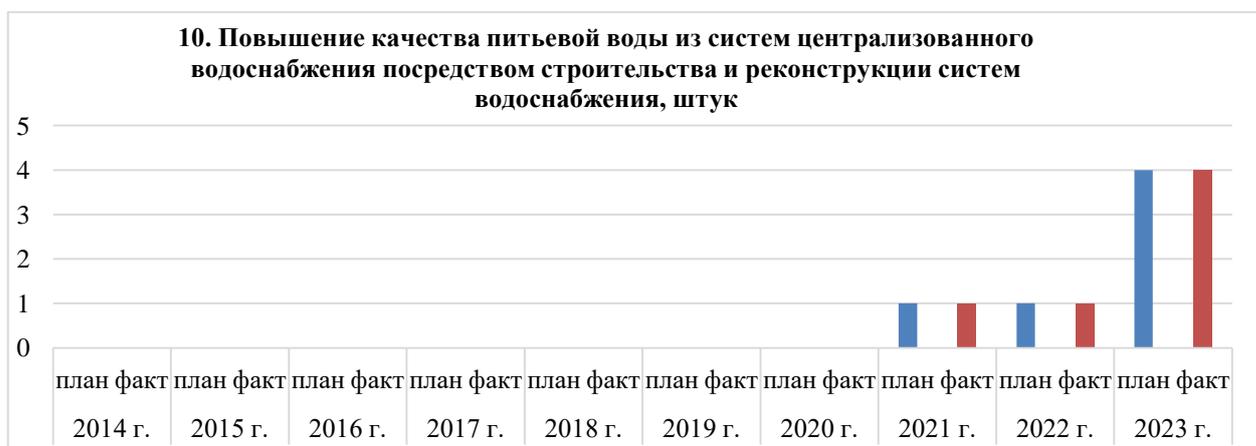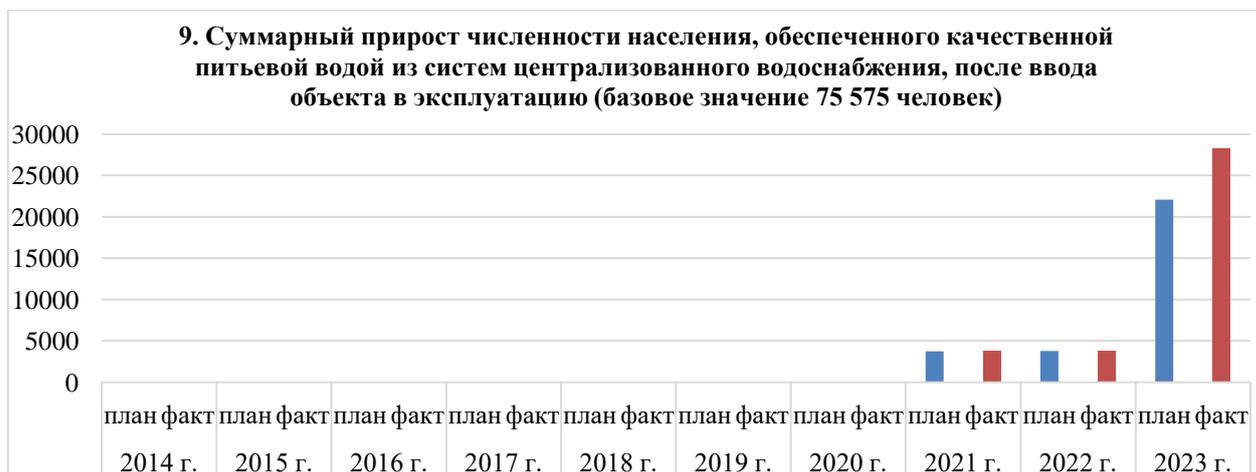




В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» в 2017 году установлено достижение 5 показателей:

№ п/п	Наименование показателя (единица измерения)	План	Факт	Примечание
1	Количество реализованных на территории Республики Тыва проектов по благоустройству (шт.)	1	7	в 2017 году в проекте участвовало 7 муниципальных образований
2	Количество представителей муниципальных образований Республики Тыва, прошедших обучение по программе «Создание комфортной среды»	10	50	представители муниципальных образований Республики Тыва прошли обучение по программе «Создание комфортной среды»
3	Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий	30	30	в 2017 году всего благоустроено 30 дворовых территорий
4	Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.).	1	9	в 2017 году всего благоустроено 9 общественных территорий
5	Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	1	1	в 2017 году благоустроен парк г. Кызыла

Целевые показатели подпрограммы «Чистая вода» установленные федеральным проектом «Чистая вода» за 2019-2023 годы:

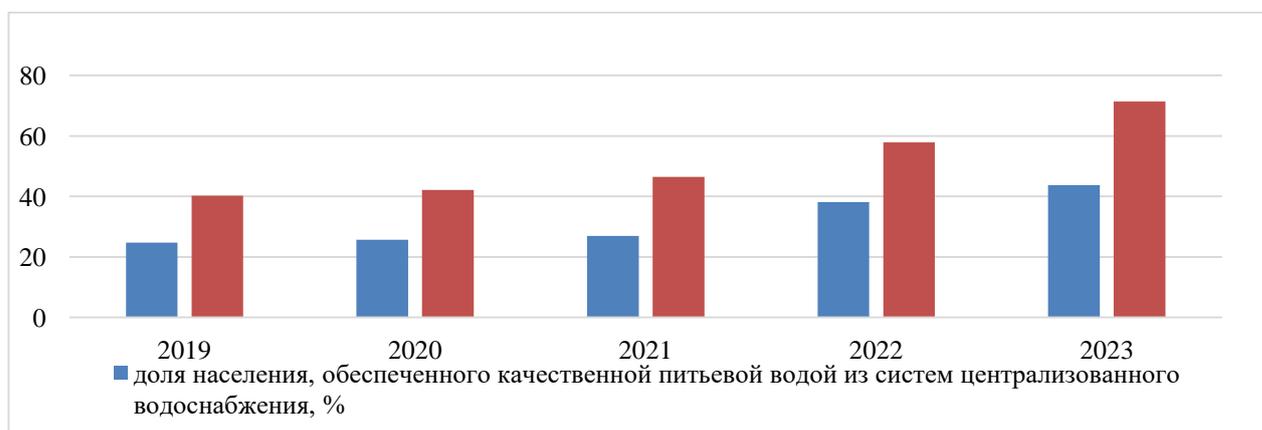

5. Итоги

Общие выводы о выполнении поставленных задач и достижении целей государственной программы за весь период реализации.

Достигнутый эффект по целевым показателям.

За 2017 год целевые показатели и результаты подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» достигнуты.

Республикой Тыва за 2019-2023 годы целевые показатели и результаты, установленные федеральным проектом «Чистая вода», достигнуты в полном объеме (нарастающим итогом):

- доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, – 43,7 процента;

- доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, – 71,41 процента;

- количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки – 4 шт. с нарастающим итогом (в 2022 г. – 1 шт.; в 2023 г. – 3 шт.).

Благодаря региональному проекту «Чистая вода» прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составило 28 296 человек.

Безопасными и благоприятными условиями проживания обеспечены жители 27 построенных многоквартирных домов по программе переселения граждан из аварийного жилья и жилых домов для детей-сирот в с. Хову-Аксы и г. Кызыле.

Перевыполнен показатель по обновлению технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства спецтехникой, с 2014 по 2023 годы благодаря подпрограмме «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва техникой, в том числе специализированной, на 2014-2025 годы» в количестве 116 единиц.

Сохранены рабочие места в действующих малых котельных и водоснабжающих организациях в количестве 546 единиц.

Созданы рабочие места за весь период реализации государственной программы в количестве 1274 единицы, при плане 1269 единиц.

В 2022 году построен 1 угольный склад в г. Кызыле и обустроено 7 топливных (угольных) складов в муниципальных образованиях – Бай-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Монгун-Тайгинском, Тес-Хемском, Тандинском, Овюрском, Эрзинском кожуунах.

В 2023 году обустроено 5 топливных (угольных) складов в г. Туране Пий-Хемского, с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского, с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна, гг. Шагонаре и Чадане.

В 2022 году ликвидированы несанкционированные свалки и вывезены ТКО в Тандинском, Сут-Хольском, Пий-Хемском, Кызылском кожуунах, в г. Чадане Дзун-Хемчикского кожууна и г. Кызыле. В 2023 году – в г. Ак-Довураке, Улуг-Хемском, Чаа-Хольском и Дзун-Хемчикском кожуунах.

В 2022 году приобретена 221 единица бункеров для сборов твердых коммунальных отходов объемом 8 куб. м при плане 150 штук, что на 47 процентов больше.

В 2023 году приобретено 170 бункеров и 218 контейнеров для сбора отходов при плане 143 ед., что на 171 процент больше.

Министерством ЖКХ Республики Тыва совместно с Минстроем Республики Тыва разработана новая государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 14 ноября 2023 г. № 834, которая будет реализована в период с 2024 по 2030 годы.

Приложение
к докладу о реализации государственной
программы Республики Тыва
«Повышение эффективности и
надежности функционирования
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Тыва на 2014-2025 годы»
за период с 2014 по 2023 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности
и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства
Республики Тыва на 2014-2025 годы» с 2014 по 2023 годы

Наименование индикатора	Ответственный исполнитель	Единица измерения	Значения индикатора																			
			2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. Обновление технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства техникой, в том числе специализированной	Министерство ЖКХ Республики Тыва	единиц	4	4	0	0	0	0	6	6	7	7	8	8	5	5	7	7	6	67	10	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8. Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2024 году до показателя 47,6 процента (базовое значение 24,5 процента)	Минстрой Республики Тыва	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	24,7	25,7	25,7	28	28	38,1	38,1	43,7	43,7
9. Суммарный прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию (базовое значение 75 575 чел.)	Минстрой Республики Тыва	человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	на 3731	на 3731	на 3779	на 3779	на 22087	на 28296
10. Повышение качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения посредством строительства и реконструкции систем водоснабжения	Минстрой Республики Тыва	штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11. Строительство и обустройство угольных складов	Министерство ЖКХ Республики Тыва	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	5	5
12. Ликвидация стихийных свалок	Министерство ЖКХ Республики Тыва	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	4	4
13. Приобретение оборудования по сбору ТКО	Министерство ЖКХ Республики Тыва	штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	221	143	388
